

# 香美町体育施設個別施設計画

平成 30 年 3 月

香美町

(生涯学習課・観光商工課・教育総務課)



# 目 次

1	基本事項	
(1)	計画の目的と位置づけ	1
(2)	計画期間	1
(3)	対象施設	1
2	施設の現況及び将来の見通し	
(1)	保有状況	2
(2)	点検・診断の実施状況	3
(3)	管理運営の状況	3
(4)	利用状況	4
(5)	保全・更新費用の見通し	5
(6)	管理運営費等の見通し	5
3	再編に関する事項	
(1)	再編の方向性の検討方法	6
(2)	再編スケジュール	9
4	保全・更新等に関する事項	
(1)	保全・更新等の検討方法	10
(2)	保全・更新等スケジュール	11
5	管理運営に関する事項	
(1)	管理運営の見直しの検討方法	12
(2)	管理運営の見直しスケジュール	13
6	公共施設等マネジメントによる効果	
(1)	保有量	14
(2)	保全・更新等費用	14
(3)	管理運営費等	14
7	フォローアップの実施方針	
(1)	フォローアップの実施方針	15


※本計画書中に記載している表の数値は、四捨五入の関係で数値の合計が合わない場合があります。

# 1 基本事項

## (1) 計画の目的と位置づけ

本計画は、平成 29 年 3 月に策定した「香美町公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）に基づき、公共施設等の老朽化問題に対応し、財政負担の軽減・平準化を目指していくため、公共施設等マネジメント（保有する公共施設等を有効活用しつつ、施設保有量の見直しや計画的な保全による施設の長寿命化を図るための取組）を推進していくための体育施設に係る個別施設ごとの具体的な対応方針を示したものです。

また、本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画（インフラ長寿命化計画＝総合管理計画）に基づく実施計画である個別施設計画（個別施設ごとの長寿命化計画）として位置づけます。

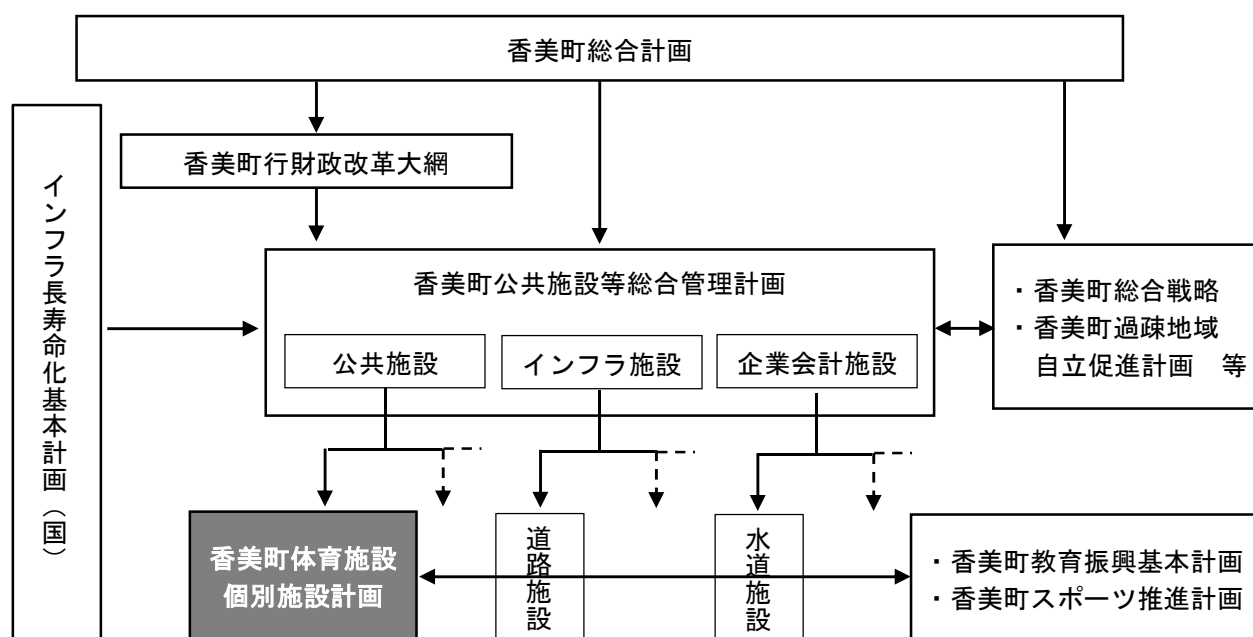

## (2) 計画期間

本計画の計画期間は、2017 年度（平成 29 年度）から 2026 年度（平成 38 年度）までの 10 年間とします。総合管理計画の計画期間である 2017 年度（平成 29 年度）から 2046 年度（平成 58 年度）までの 30 年間で 3 期に分け、本計画はその第 1 期分とします。

なお、原則として計画期間の中間となる 5 年目（2021 年度（平成 33 年度））に見直しを行うこととしますが、本町を取り巻く社会経済情勢の変化等により、見直しが必要な場合は適宜見直しを行っていきます。

## (3) 対象施設

本計画の対象施設は、総合管理計画における施設分類の体育施設（屋内体育施設、屋外体育施設）とします。

## 2 施設の現況及び将来の見通し

### (1) 保有状況

平成27年度末現在の施設の保有状況は以下のとおりです。(総合管理計画との比較を行うため、保有状況については、総合管理計画と同じ平成27年度末時点としています。)

分類	施設名	整備年度	延床面積 (㎡)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
屋内体育施設	香住B&G海洋センター	S61	2,638	301,813	219,587	72.8
	村岡体育館	S48	965	57,397	53,890	93.9
	福岡体育館	S54	1,788	130,000	104,424	80.3
	射添体育館	H13	1,317	451,410	305,122	67.6
	味取体育館	S54	465	49,400	40,136	81.2
	山田体育館	S58	450	53,000	39,179	73.9
	農業者健康管理施設「おじろドーム」	S63	1,255	286,336	177,752	62.1
	小計		8,878	1,329,356	940,090	70.7
屋外体育施設	今子浦運動場	H13	33	124,025	92,139	74.3
	射添グラウンド	S58	15	900	900	100.0
	祖岡すこやか広場	S56	46	17,470	17,470	100.0
	広井多目的山村広場	S63	99	41,280	40,005	96.9
	小代健康公園	H19	70	72,629	32,320	44.5
	小計		263	256,304	182,834	71.3
合計		9,141	1,585,660	1,122,924	70.8	

### 【参考：学校施設開放分（体育館）】

※学校施設開放・・・学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般住民の利用に供することにより、社会体育等の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保を図ることを目的とする。

分類	施設名	整備年度	延床面積 (㎡)	取得価額 (千円)	減価償却累計額 (千円)	資産減価償却率 (%)
小学校	香住小学校 体育館	S41	1,139	155,849	68,023	43.6
	奥佐津小学校 体育館	S46	472	126,439	21,926	17.3
	佐津小学校 体育館	S51	515	142,236	73,806	51.9
	柴山小学校 体育館	H2	1,089	232,836	122,245	52.5
	長井小学校 体育館	S52	509	54,400	46,210	84.9
	余部小学校 体育館	S53	501	50,414	42,010	83.3
	余部小学校御崎分校 体育館	S58	71	7,291	7,291	100.0
	村岡小学校 体育館	S44	937	205,314	36,432	17.7
	兔塚小学校 体育館	S47	1,176	229,406	41,594	18.1
	射添小学校 体育館	S50	854	226,704	72,920	32.2
	小代小学校 体育館	H20	720	220,524	52,223	23.7
	小計		7,983	1,651,413	584,680	35.4
中学校	香住第一中学校 体育館	S49	1,550	242,978	113,054	46.5
	香住第二中学校 体育館	H3	1,128	247,525	126,510	51.1
	村岡中学校 体育館	H1	1,287	253,406	138,707	54.7
	小代中学校 体育館	H8	1,194	341,195	148,837	43.6
	小計		5,159	1,085,104	527,108	48.6
合計		13,142	2,736,517	1,111,788	40.6	

## (2) 点検・診断の実施状況

点検・診断の実施状況は以下のとおりです。

区分	点検等名称	周期	分類	対象施設名称	最終点検日	
法定点検	電気事業法	電気設備保守点検	1回/年	屋外体育施設	今子浦運動場	H28. 5. 11
				屋内体育施設	香住B&G海洋センター	H28. 5. 13
	消防法	消防設備保安点検	1回/6月	屋内体育施設	香住B&G海洋センター	H29. 2. 23
					福岡体育館	H29. 3. 30
					射添体育館	H29. 1. 27
					味取体育館	H29. 3. 30
					山田体育館	H29. 3. 30
					農業者健康管理施設「おじろドーム」	H29. 1. 12
	浄化槽法	浄化槽維持管理	1回/年	屋内体育施設	香住B&G海洋センター	H28. 11. 22
山田体育館					H28. 9. 13	

※最終点検日は平成28年度末時点

## (3) 管理運営の状況

### ① 管理運営方式

管理運営方式の状況は以下のとおりです。

方式区分				施設数	
公設公営	直営方式			直	11施設
公設民営	指定管理者方式	委託費支払型		指-委	0施設
		利用料金型		指-料	0施設
		併用型		指-併	1施設
		費用負担無し型		指-無	0施設
		その他型		指-他	0施設
	施設貸与方式			貸	0施設

### ② 管理運営費

平成26年度から平成28年度の3年間の管理運営費の状況は以下のとおりです。

分類	施設名	管理運営方式	歳出(千円)			歳入(千円)			実質負担額(千円)			
			H26	H27	H28	H26	H27	H28	H26	H27	H28	H28-H26 増減率
屋内体育施設	香住B&G海洋センター	直	11,365	12,125	13,527	625	601	566	10,740	11,524	12,961	20.7
	村岡体育館	直	215	162	192	114	62	51	101	100	142	40.6
	福岡体育館	直	2,898	4,094	2,920	832	577	668	2,066	3,517	2,252	9.0
	射添体育館	直	2,771	2,149	2,080	172	844	888	2,598	1,305	1,193	▲ 54.1
	味取体育館	直	703	550	693	2	0	0	701	550	693	▲ 1.1
	山田体育館	直	311	305	1,025	0	0	0	311	305	1,025	229.6
	農業者健康管理施設「おじろドーム」	直	1,095	1,297	1,227	104	81	119	990	1,216	1,108	11.9
	小計		19,358	20,683	21,664	1,850	2,164	2,291	17,508	18,519	19,373	10.7
屋外体育施設	今子浦運動場	指-併	3,146	3,220	6,993	199	224	278	2,947	2,996	6,716	127.9
	射添グラウンド	直	254	106	428	41	62	16	213	44	412	93.4
	租岡すこやか広場	直	398	406	360	6	0	15	392	406	345	▲ 12.0
	広井多目的山村広場	直	518	686	587	30	29	49	488	657	538	10.2
	小代健康公園	直	2,989	2,684	2,776	41	27	18	2,949	2,657	2,757	▲ 6.5
	小計		7,304	7,102	11,144	316	342	376	6,988	6,760	10,768	54.1
合計			26,662	27,785	32,807	2,166	2,506	2,667	24,496	25,279	30,141	23.0

#### (4) 利用状況

平成26年度から平成28年度の3年間の利用状況は以下のとおりです。

分類	施設名	種別	H26	H27	H28	H28-H26 増減率
屋内体育 施設	香住B&G海洋センター	利用者数 (人)	45,333	45,562	44,098	▲ 2.7
	村岡体育館		13,339	16,652	14,839	11.2
	福岡体育館		13,432	17,432	9,981	▲ 25.7
	射添体育館		13,232	18,564	12,049	▲ 8.9
	味取体育館		226	352	334	47.8
	山田体育館		1,228	1,439	1,186	▲ 3.4
	農業者健康管理施設「おじろドーム」		4,834	4,401	3,088	▲ 36.1
	計		91,624	104,402	85,575	▲ 6.6
屋外体育 施設	今子浦運動場	利用者数 (人)	4,425	2,815	2,190	▲ 50.5
	射添グラウンド		3,044	2,980	3,947	29.7
	祖岡すこやか広場		1,589	2,700	3,452	117.2
	広井多目的山村広場		1,540	2,020	1,187	▲ 22.9
	小代健康公園		3,028	3,690	2,905	▲ 4.1
	計		13,626	14,205	13,681	0.4

#### 【参考：学校施設開放分（体育館）】

分類	施設名	種別	H26	H27	H28	H28-H26 増減率
小学校	香住小学校 体育館	利用者数 (人)	12,871	18,338	23,785	84.8
	奥佐津小学校 体育館		3,143 ※	724	1,828	▲ 41.8
	佐津小学校 体育館		3,482	2,800	2,855	▲ 18.0
	柴山小学校 体育館		3,701	3,967	3,770	1.9
	長井小学校 体育館		1,934	1,977 ※	565	▲ 70.8
	余部小学校 体育館		1,825	1,607 ※	836	▲ 54.2
	余部小学校御崎分校 体育館		0	0	0	—
	村岡小学校 体育館		※ 488	5,370	5,610	1,049.6
	兎塚小学校 体育館		3,770 ※	1,021	2,340	▲ 37.9
	射添小学校 体育館		530 ※	254	486	▲ 8.3
	小代小学校 体育館		2,614	4,667	4,582	75.3
	計		34,358	40,725	46,657	35.8
中学校	香住第一中学校 体育館	利用者数 (人)	4,600	5,154	5,332	15.9
	香住第二中学校 体育館		894	962	630	▲ 29.5
	村岡中学校 体育館		2,884	4,068	2,538	▲ 12.0
	小代中学校 体育館		2,175	2,132	2,335	7.4
	計		10,553	12,316	10,835	2.7

※印の利用者数は、大規模改修工事により一定期間使用できない期間があります。

### (5) 保全・更新費用の見通し

総合管理計画における今後40年間の保全・更新費用の見通しは以下のとおりです。(総務省が公開している「公共施設更新費用試算ソフト」と同様の条件・単価で試算しています。)

分類	区分	保全・更新費用(千円)				合計
		1～10年目 2017(H29)～ 2026(H38)	11～20年目 2027(H39)～ 2036(H48)	21～30年目 2037(H49)～ 2046(H58)	31～40年目 2047(H59)～ 2056(H68)	
屋内体育施設	保全	994,200	263,200	0	0	1,257,400
	更新	0	347,500	1,612,200	762,700	2,722,400
	計	994,200	610,700	1,612,200	762,700	3,979,800
屋外体育施設	保全	38,600	8,700	5,300	0	52,600
	更新	0	0	21,900	47,600	69,500
	計	38,600	8,700	27,200	47,600	122,100
合計	保全	1,032,800	271,900	5,300	0	1,310,000
	更新	0	347,500	1,634,100	810,300	2,791,900
	合計	1,032,800	619,400	1,639,400	810,300	4,101,900

### (6) 管理運営費等の見通し

過去3年間(H26-H28)の実績値等を基に推計した計画期間内における管理運営費等の見通しは以下のとおりです。(修繕料については、築年数による面積あたり単価を設定し、試算しています。)

分類	管理運営費等(千円)		
	2017(H29)～2026(H38)		
	歳出	歳入	実質負担額
屋内体育施設	244,655	22,838	221,817
屋外体育施設	69,386	3,389	65,997
合計	314,041	26,227	287,814



### 3 再編に関する事項

#### (1) 再編の方向性の検討方法

計画期間内の再編の方向性については、総合管理計画による再編の実施方針に基づいた以下の分類ごとの考え方を基本としながら、施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分けて評価を行う施設評価を実施し、総合的に検討を行いました。

また、検討に当たっては、平成 28 年度に実施した公共施設に関する町民アンケート結果も参考にしています。


なお、今回検討した再編の方向性については、町における現時点の基本的な方向性（考え方）を示したものです。実際に再編を検討する際には、この方向性をふまえ、具体的な実施方法等について関係者等と一緒に検討・調整を行い、これまでどおり段階を踏んで進めていきます。

#### ① 再編の考え方

分類	再編の考え方
屋内体育施設	・屋内体育施設については、小中学校体育館の積極的な一般開放による利用も考慮し、町内での施設配置・規模・機能のあり方を明確にした上で、施設の再編について検討します。
屋外体育施設	・屋外体育施設における建物施設の機能については、倉庫とトイレ機能のみを前提とし、それ以外の建物施設については、廃止に向けた検討を行います。

#### ② 1次評価

1次評価は、品質（減価償却率）・供給（利用率等）・財務（面積あたり維持管理費）の観点から、下図のとおり品質（ハード）と供給（ソフト）、品質（ハード）と財務（ソフト）の2軸により「A」、「B1」、「B2」、「C」の4つに分類し、評価しました。

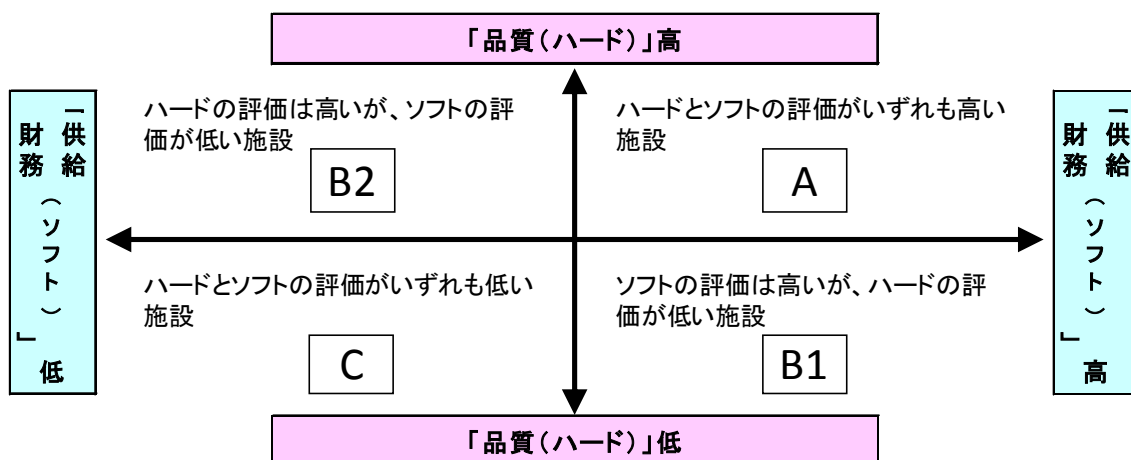

### ③ 2次評価

2次評価は、公共性、有効性、効率性、代替性、特質性の5つの区分から、それぞれ「A」、「B」、「C」の3段階で評価しました。

区分	評価	内容
公共性	A：高い B：普通 C：低い	法律等により設置が義務付けられているか
		町民の安全・安心の確保等、町民生活を営む上での必要性は高いか
		町の施策を推進する上での必要性は高いか
		設置目的の意義が低下していないか
		サービス内容が設置目的に即しているか
		利用実態が設置目的に即しているか
有効性	A：高い	利用者数等の見込みはどうか
	B：普通	利用実態からみた利用圏域はどうか
	C：低い	施設（敷地・建物）に余裕スペースがないか
効率性	A：高い	民間事業者のノウハウが活用できるか
	B：普通	
	C：低い	支出に対する利用料等の収入の割合はどうか
代替性	A：低い	利用圏域内に民間又は国県による同種のサービスを提供している施設があるか
	B：普通	他自治体との広域的な連携が可能か
	C：高い	民間施設等を活用した利用補助等に対応できるか
特質性	A：高い B：普通 C：低い	歴史的、文化的、象徴的価値のある施設か
		再編の検討にあたり、施設整備に係る国県補助金、起債の償還、施設用地の借地契約期間等による制限はあるか
		施設整備に係る管理・利用団体等からの負担はあるか
		浸水想定区域・土砂災害警戒区域等内に設置されている施設か
		避難所・投票所等に指定されているか

#### ④ 総合評価

再編の考え方及び1次・2次評価の結果等を踏まえ、以下の区分のとおり施設を機能（ソフト）と建物等（ハード）に分け評価を行い、計画期間内の再編の方向性を検討しました。

区分	総合評価	評価の説明
機能 (ソフト)	継続	現在の機能を継続して提供します。(他の公共施設へ機能を移転し、継続して提供する場合も含まれます。)
	新規	新たに機能を提供します。
	移譲	現在の機能を民間事業者等へ移譲します。
	廃止	現在の機能を廃止します。(他の公共施設へ機能を統合し、廃止する場合も含まれます。)
建物等 (ハード)	維持	現在の建物等を維持します。(複数棟ある施設について、一部の建物等を解体撤去する場合も含まれます。)
	大規模改修	長寿命化等のため、建物等を全面的に改修します。
	更新	老朽化等のため、建物等を更新します。(他の場所へ建物等を移転し、更新する場合も含まれます。)
	新築	新たな機能の提供に伴い、建物等を新築します。
	既設	新たな機能の提供に伴い、既存の建物等を利用します。
	譲渡	現在の建物等を民間事業者等へ譲渡します。
	解体撤去	現在の建物等を解体撤去します。

#### ⑤ 評価結果

分類	施設名	1次評価		2次評価					総合評価		延床面積 (㎡)
		品質 供給	品質 財務	公共	有効	効率	代替	特質	機能	建物等	
屋内体育 施設	香住B&G海洋センター	B 1	C	A	B	B	A	B	継続	維持	2,638
	村岡体育館	B 1	B 1	A	B	B	B	B	継続	維持	965
	福岡体育館	C	B 1	A	B	B	B	B	継続	維持	1,788
	射添体育館	C	B 1	A	B	B	B	B	継続	維持	1,317
	味取体育館	C	B 1	B	C	B	B	B	廃止 (統合)	解体撤去	0
	山田体育館	C	C	B	C	B	B	B	廃止 (統合)	解体撤去	0
	農業者健康管理施設「おじろドーム」	C	B 1	A	B	B	A	B	継続	維持	1,255
	小計										7,963
屋外体育 施設	今子浦運動場	C	C	A	B	B	A	A	継続	維持	43
	射添グラウンド	B 1	B 1	A	B	B	B	B	継続	維持	15
	祖岡すこやか広場	B 1	B 1	A	B	B	B	B	継続	維持	46
	広井多目的山村広場	C	B 1	A	B	B	A	B	継続	維持	99
	小代健康公園	A	A	A	B	B	A	B	継続	維持	70
	小計										272
合計										8,235	

## (2) 再編スケジュール

総合評価において、再編を実施することとした施設における再編スケジュールを、前期5年と後期5年間に分けて以下のとおり検討しました。(総合管理計画との比較を行うため、2016年度(平成28年度)中の再編についても記載しています。)

分類	施設名	区分	2016 (H28)	前期 2017(H29)～2021(H33)	後期 2022(H34)～2026(H38)
屋内体育 施設	味取体育館	機能		廃止(統合)	
		建物等		解体撤去	
	山田体育館	機能			廃止(統合)
		建物等			解体撤去

### 【実施方針】

分類	施設名	実施方針
屋内体育 施設	味取体育館	施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、機能を射添体育館に統合し、建物等は解体撤去することとします。ただし、建物等の受け入れ先がある場合は譲渡することとします。
	山田体育館	施設の老朽化及び利用実態を踏まえ、機能を射添体育館に統合し、建物等は解体撤去することとします。ただし、建物等の受け入れ先がある場合は譲渡することとします。

## 4 保全・更新等に関する事項

### (1) 保全・更新等の検討方法

計画期間内の保全・更新等については、総合管理計画による維持管理・修繕・更新等、安全確保、耐震化、長寿命化の実施方針及び「3再編に関する事項」の「(2)再編スケジュール」に基づき、以下の方法で検討を行いました。

なお、今回検討した保全・更新等については、以下の方法に基づいて検討した目安となる実施時期及び費用を示したものです。

#### ① 保全・更新等の区分

以下のとおり保全、更新、その他の3つに区分しました。

区分	内容
保全	建築（屋根・外壁等）、電気設備（受変電設備等）、機械設備（空調設備等）、昇降機設備等の代表的な部位に係る予防修繕・改修 ※部位別に修繕・改修周期を設定 ※構造別に使用目標年数を設定 ※事後修繕については、「5 管理運営に関する事項」で検討
更新	建物等全体の更新
その他	新築、解体撤去、耐震化、バリアフリー化、省エネルギー設備の導入等

#### ② 保全・更新等に係る費用の算出方法

保全・更新等に係る具体的な費用を算出していない施設については、以下の方法で費用を算出しました。

区分	算出方法
保全	固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、施設の用途別に部位ごとの構成比率等を設定し、予防修繕・改修に係る費用を算出
更新	固定資産台帳による取得価額又は再調達価額を基に、更新時の解体費用等も考慮し、更新費用を算出
その他	他の公共施設での実績等を基に費用を算出

#### ③ 保全・更新等の優先順位

防災面で拠点的役割を果たす施設や不特定多数の利用者がある施設を優先するとともに修繕・改修履歴及び点検結果等による施設の劣化状況に応じて、保全・更新等の優先順位を検討しました。

## (2) 保全・更新等スケジュール

保全・更新等の優先順位を考慮しながら、施設の長寿命化・財政負担の平準化を行うため、保全・更新等スケジュールを前期5年間と後期5年間に分けて以下のとおり検討しました。(総合管理計画との比較を行うため、2016年度(平成28年度)中の保全・更新等についても記載しています。)

分類	施設名	区分等		使用 目標 年数 (年)	保全・更新等費用(千円)			
					2016 (H28)	前期 2017(H29) ~2021(H33)	後期 2022(H34) ~2026(H38)	合計
屋内体育 施設	香住B&G海洋センター	保全	屋根・外壁等	80	800	16,500	9,200	26,500
		その他	LED化・トイレ洋式化		0	13,300	0	13,300
	村岡体育館	保全	屋根等	60	0	4,900	29,800	34,700
		その他	耐震化		0	5,000	20,000	25,000
	射添体育館	その他	LED化	60	0	7,000	0	7,000
	味取体育館	その他	解体撤去	—	0	23,300	0	23,300
	山田体育館	その他	解体撤去	—	0	0	22,500	22,500
	農業者健康管理施設「おじろドーム」	保全	屋根・外壁等	80	0	400	43,500	43,900
		その他	LED化等		7,100	5,000	0	12,100
	小計	保全			800	21,800	82,500	105,100
更新			0	0	0	0		
その他			7,100	53,600	42,500	103,200		
計			7,900	75,400	125,000	208,300		
屋外体育 施設	今子浦運動場	保全	屋根・外壁・フェンス等	50	0	12,200	0	12,200
	射添グラウンド	保全	フェンス・照明施設等	50	0	1,400	4,100	5,500
	租岡すこやか広場	保全	給水施設等	50	0	2,400	0	2,400
		更新	フェンス		0	6,500	0	6,500
	小代健康公園	保全	照明施設	50	0	0	2,100	2,100
		その他	新築(倉庫)		0	900	0	900
	小計	保全			0	16,000	6,200	22,200
更新			0	6,500	0	6,500		
その他			0	900	0	900		
計			0	23,400	6,200	29,600		
合計	保全			800	37,800	88,700	127,300	
	更新			0	6,500	0	6,500	
	その他			7,100	54,500	42,500	104,100	
	計			7,900	98,800	131,200	237,900	

## 5 管理運営に関する事項

### (1) 管理運営の見直しの検討方法

計画期間内の管理運営については、総合管理計画による効率的な管理運営の実施方針、「3 再編に関する事項」の「(2) 再編スケジュール」及び「4 保全・更新等に関する事項」の「(2) 保全・更新等スケジュール」に基づき、以下の項目について検討を行いました。

なお、今回検討した管理運営費等については、以下の方法に基づいて算出した目安となる費用等を示したものです。

また、今回具体的な検討結果を示すことができなかった指定管理者制度のあり方や利用者負担のあり方の検証については、引き続き検討を行うこととします。

区分		主な見直し内容及び算出方法
歳出	全般	再編スケジュールに基づく見直し 移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を0円として算出 新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳出を見込みにより算出
	光熱水費	電力入札による電気料金の見直し 一定規模以上の施設に対し電力入札を実施することとし、過去3年間(H26-H28)の平均値に一定割合を減じて算出
	維持管理費	再編スケジュールに基づく見直し 大規模改修・更新と評価した施設については、再編実施年度の翌年度を築1年目として修繕料を算出(修繕料は、築年数による面積あたり単価を設定し算出)
歳入	全般	再編スケジュールに基づく見直し 移譲・廃止・譲渡・解体撤去と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳入を0円として算出 新規・新築と評価した施設については、再編実施年度の翌年度以降の歳入を見込みにより算出

## (2) 管理運営の見直しスケジュール

管理運営の見直しの検討内容を基に、管理運営の見直しスケジュールを前期5年間と後期5年間に分けて以下のとおり検討しました。

分類	施設名	見直し内容	管理運営費等（千円）								
			前期 2017(H29)～2021(H33)			後期 2022(H34)～2026(H38)			合計		
			歳出	歳入	実質負担額	歳出	歳入	実質負担額	歳出	歳入	実質負担額
屋内体育施設	香住B&G海洋センター	電力入札	66,555	2,871	63,684	66,439	2,871	63,568	132,994	5,742	127,252
	村岡体育館		3,715	377	3,338	3,715	377	3,338	7,430	754	6,676
	福岡体育館	電力入札	20,086	3,461	16,625	20,009	3,461	16,548	40,095	6,922	33,173
	射添体育館	※統合先・電力入札	12,215	4,263	7,952	14,301	4,267	10,034	26,516	8,530	17,986
	味取体育館	廃止(統合)/解体撤去	4,379	4	4,375	0	0	0	4,379	4	4,375
	山田体育館	廃止(統合)/解体撤去	3,257	0	3,257	2,606	0	2,606	5,863	0	5,863
	農業者健康管理施設「おじろドーム」	電力入札	10,710	443	10,266	10,527	443	10,084	21,237	886	20,350
	小計		120,917	11,419	109,497	117,597	11,419	106,178	238,514	22,838	215,675
屋外体育施設	今子浦運動場	電力入札	15,324	1,139	14,185	15,100	1,139	13,962	30,424	2,278	28,147
	射添グラウンド		617	198	419	617	198	419	1,234	396	838
	租岡すこやか広場		1,747	35	1,712	1,747	35	1,712	3,494	70	3,424
	広井多目的山村広場		3,255	180	3,075	3,246	180	3,065	6,501	360	6,140
	小代健康公園		13,444	143	13,302	13,413	143	13,271	26,857	286	26,573
	小計		34,387	1,695	32,693	34,123	1,695	32,429	68,510	3,390	65,122
合計			155,304	13,114	142,190	151,720	13,114	138,607	307,024	26,228	280,797



## 6 公共施設等マネジメントによる効果

### (1) 保有量

計画前（延床面積） （2015（H27）末）	計画後（延床面積） （2026（H38）末）	効果（延床面積）
9,141 m <sup>2</sup>	8,235 m <sup>2</sup>	▲906 m <sup>2</sup> （▲9.9%）
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・解体撤去による減（▲915 m<sup>2</sup>）</li> </ul>		

### (2) 保全・更新等費用

計画前 （2017（H29）～2026（H38））	計画後 （2016（H28）～2026（H38））	効果
1,032,800 千円	237,900 千円	▲794,900 千円（▲77.0%）
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平準化、解体撤去による保全費用の減（▲905,500 千円）</li> <li>・老朽化による更新費用の増（6,500 千円）</li> <li>・新築、解体撤去、耐震化、LED化等によるその他費用の増（104,100 千円）</li> </ul>		

### (3) 管理運営費等

計画前（実質負担額） （2017（H29）～2026（H38））	計画後（実質負担額） （2017（H29）～2026（H38））	効果
287,814 千円	280,797 千円	▲7,017 千円（▲2.4%）
主な要因		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・再編（廃止（統合）/解体撤去）、電力入札による減（▲7,017 千円）</li> </ul>		

## 7 フォローアップの実施方針

### (1) フォローアップの実施方針

本計画を着実に推進していくためには、以下のP D C Aサイクルに基づき、継続的に計画の評価・見直しを行いながら推進していきます。

